



## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>59 Nolu KÖK Yapılması İşi</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	05.06.2017 – Devam Ediyor
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Avanos Gülşehir Yolu 10. km TEİAŞ Trafo Merkezi Yukarı Kısmı AVANOS
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Avanos Trafo Merkezinden Çıkan Fider 3 Enerji Nakil Hattı, Çok Uzun Olması Sebebiyle ve Dağıtım Merkezinden Çıkıp Eski Hattı Bağlantı Noktasına Direk Bağlanması Nedeniyle. Yeni Hattın Bağlantı Noktasına Kesici Ölçü Kabini Montajı Yapılarak. Arızanın Tespiti Kolaylaşacaktır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	129.609,17 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	127.091,18 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	129.609,17 TL
<b>NAKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 98
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%100
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>Ürgüp 370 Evler Mahallesi Yeni Trafo Bölgesi Oluşturulması ve TR44 Kapasite Artışı</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	05.07.2017 – Devam Ediyor
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	370 Evler Mahallesi Ürgüp
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Nevşehir ili Ürgüp İlçesine bağlı 370 Evler Mahallesinde yeni yapılaşma alanında mevcut trafo kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle yeni trafo bölgesi oluşturulması ve mevcut trafonun kapasitenin artırılması yapılacaktır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	524.640,31 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	171999,24 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	524.640,31 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 34,51
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 50
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>ACIGÖL FİDER 16 (KÖK BİNASI KONULMASI)</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	01.06.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Acıgöl Merkez Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	167.536,11 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	265.585,6 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	167.536,11 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%0,01
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%70.52
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur. Tesis çalışması devam ediyor.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>Ayhanlar Trafo İlavesi ve Köy Şebekesi Islahı</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	05.07.2017 – Devam Ediyor
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Ayhanlar Köyü Avanos
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Nevşehir İli Avanos İlçesi Ayhanlar Köyündeki elektrik şebekesi köye ilk elektrik geldiğinde yapılmış olup, Şebeke ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Arıza fazlalığı ve süt sağma makinelerinin aynı anda kullanımı sebebiyle gerilim düşümü yaşanmaktadır. Bu sebeple ilave trafo yapılması ve şebeke ıslahı ile şebekedeki direklerin çoğunluğu değişecektir.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	835.694,31 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	392.020,94 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	835.694,31 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 47
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 70
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>BÜYÜKBURUNAĞIL KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ VE İRTİBATI YAPILMASI</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	05.06.2017-31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Büyükburunağıl Köyü Hacıbektas/NEVŞEHİR
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	112.330,14 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	105.155,25 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	112.330,14 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%95
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%100
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>CEVDET BEY SOKAK AYDINLATMA TESİS YAPIM İŞİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	15.09.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Cevher Dudayev Mahallesi .Cevdet Bey Sokak .Merkez Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Sokağın aydınlatmasının yetersiz olması sebebi ile yeni aydınlatma tesisi yapılması planlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	49.327,5435 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	265.585,6 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	49.327,5435
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%28,06
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%90.52
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.Tesis çalışması devam ediyor.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>DERINKUYU F7 TARIMSAL SULAMA KÖK</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	10.07.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Derinkuyu / Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	189,352,45 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	0
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	189,352,45 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 0
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 30
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR


<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>DERINKUYU F7-6 TARIMSAL SULAMA KÖK</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	10.07.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Derinkuyu / Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	202,080,32 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	0
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	202,080,32 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 0
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%30
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	




## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>Ürgüp Duayeri Mahallesi Trafo İlavesi</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	12.10.2017 – Devam Ediyor.
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Duayeri Mahallesi Ürgüp
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Nevşehir ili, Ürgüp ilçesine bağlı Duayeri mahallesinde mevcut şebekenin kolları uzun olması sebebiyle kış aylarında gerilim düşümü yaşanmaktadır. Bu sebeple yeni bir trafo bölgesi oluşturulması planlanmaktadır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	233.934,76 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	0 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	233.934,76 TL
<b>NAKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 0
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 0
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>YENİ AVANOS TM GÜLŞEHİR İM ENERJİ NAKİL HATTI</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	05.06.2017-31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Yeniyaylacık Köyü Gülşehir/NEVŞEHİR
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Gülşehir ilçemize kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanması için yeni bir Enerji Nakil Hattı yapılması planlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	3.863.917,84 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	3.304.545,70 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	3.863,917,84 TL
<b>NAKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 90
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%95
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR


<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>GÜLŞEHİR MERKEZ TR10 TRAF0 BÖLGEŞİ HİLAL YAPI KOOPERATİFİ YG-AG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	05.06.2017-31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĐU YER</b>	Fatih mahallesi Gülşehir/NEVŞEHİR
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Mevcut 160 kva lık trafonun bulunduĐu bölgede yeni binaların yapılması dolayı mevcut trafo yetersiz kalmaktadır 630 kva olarak deĐiştirilmesi planlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	218.794,99 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	141.467,78 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĐİ</b>	218.794,99 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 95
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur .
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR


<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>GÜNEYCE KÖYÜ SULAMA KÖK</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	07.06.2017 – 05.10.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Güneyce Köyü – Merkez / Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır .
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	128,515,00 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	0 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	128,515,00 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 0
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 95
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	




## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>Kalaba Yeni Mahalle Trafo İlavesi</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	15.08.2017 – Devam Ediyor
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Yeni Mahalle Kalaba Kasabası Avanos
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Nevşehir ili Avanos İlçesi Kalaba Kasabasına bağlı Yeni mahallede şebekenin uzun olması sebebiyle yeni bir trafo bölgesi oluşturulması planlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	481.520,05 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	160.413,93 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	481.520,05 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 33
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 60
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR


<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KAPAŞ SULAMA KÖK 2</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	07.06.2017 – 01.10.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Kaymaklı / Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır .
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	92,130,06 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	0
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	92,130,06 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 0
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 75
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR


<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>AVANOS YUKARI MAHALLE KESTERİÇ MEVKİİ TRAFİ İLAVESİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	05.07.2017 – Devam Ediyor
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Yukarı Mahalle Kesteriç Mevkii Avanos
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Nevşehir ili Avanos İlçesine bağlı Yukarı Mahalle Kesteriç Mevkii'ndeki mevcut şebekenin düzenlenmesi, yeni trafo bölgesi oluşturulması planlanmaktadır. Hat Sonundaki müşterilerin gerilim düşümü sorunu çözülecektir.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	193.022,71 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	140.507,50 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	193.022,71 TL
<b>NAKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 73
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 98
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	




## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KÜÇÜK EK TESİSLERİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	01.06.2017 – Devam Ediyor
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Ürgüp Ve Avanos İlçesine Bağlı Tüm Bölge
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Vatandaş Enerji Talebi ve Şebeke İyileştirmesi
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	823983,1275 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	644072,46 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	823983,1275 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 78,17
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%85
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KIZILKAYA YEŞİL HAT KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ VE İRTİBATI YAPILMASI</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	05.06.2017-31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Kızılkaya Köyü Gülşehir/NEVŞEHİR
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirilmesi amaçlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	189.004,28 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	163.030,61 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	189.004,28 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 95
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KOZAKLI TR9/A AYDINLATMASI YAPILMASI</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	05.06.2017-31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Yeni mahalle Kozaklı/Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Kozaklı belediyesi yeni yapılan konutların aydınlatmasının yapılması işi.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	38.572,14 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	36.785,21 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	38.572,14 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%95
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%100
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KUYULUTATLAR KÖK</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	İHALE AŞAMASINDA
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Kuyulutatlar Köyü – Derinkuyu / Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır .
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	402.894.30 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	0
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	402.894.30 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 0
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 0
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Proje ihale aşamasındadır
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KÜÇÜK EK TESİSLERİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	06.06.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Hacıbektaş Gülşehir ve Kozaklı İlçeleri
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Vatandaşlardan ve Mahalli idarelerden gelen acil taleplerin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlardır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	900.000,00 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	900.000,00 TL
<b>NAKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KÜÇÜK EK TESİLERİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	03.03.2017 – 01.06.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Köy Kasaba Merkez
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Vatandaşlardan ve Mahalli idarelerden gelen acil taleplerin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlardır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	326.434,92TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	265.585,6 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	326434,92
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100.00
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100.00
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR


<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KÜÇÜK EK TESİLERİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	01.06.2017 – 01.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Köy Kasaba Merkez
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Vatandaşlardan ve Mahalli idarelerden gelen acil taleplerin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlardır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	610.916.84 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	265.585,6 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	481,796.60 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%78.86
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%85.04
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR


<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KÜÇÜK EK TESİSLERİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	01.06.2017 – Devam Etmektedir
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Derinkuyu ilçesi ve Nevşehir Merkez İlçesi
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Vatandaşlardan ve Mahalli idarelerden gelen acil taleplerin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlardır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	844,772,46 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	844,772,46 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	




## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KÜÇÜK EK TESİSLERİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	03.03.2017 – 01.06.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Derinkuyu ilçesi ve Nevşehir Merkez İlçesi
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Vatandaşlardan ve Mahalli idarelerden gelen acil taleplerin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlardır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	813,593,58 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	813,593,58 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>MERKEZ TR 124 C KOLU TRAF0 İLAVESİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	22.08.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĐU YER</b>	Uçhisar Kasabası Cezaevi Yolu - Merkez Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Artan Güç taleplerini karşılamak, Kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için Mevcut Şebekeye Trafo ilave edilmiştir.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	153,002,163 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĐİ</b>	153,002,163 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%72,11
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%90
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>NEVŞEHİR FİDER 4 GÜLŞEHİR HATTINA KÖK BİNA YAPILMASI</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	01.06.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Alacaşar yolu üzeri 3 km. Merkez Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	322.548,95TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	265.585,6 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	322.548,95TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%0,01
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%70.52
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur. Tesis çalışması devam ediyor.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>NEVŞEHİR MERKEZ AVANOS YOLU ORTA REFUJ AYDINLATMASI</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	15.09.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallesi - Merkez / Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Karayolları çalışmasından ve aydınlatma şebekesinin ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle aydınlatma hatları yenilenmektedir. 203 aydınlatma direği dikilecektir.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	812,614,33 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	0
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	812,614,33 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 45
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 60
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>NEVŞEHİR MERKEZ TR 104 DEPLASESİ ŞEBEKENİN YERALTINA ALINMASI VE AYDINLATMA YAPILMASI İŞİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	22.08.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	15 Temmuz Mahallesi Merkez Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Artan Güç taleplerini karşılamak, Kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yedek besleme hatları ( RİNG) yapılarak. 250 kva direk tipi trafo 630 kVA ya yükseltilecek ve Monoblok içerisine alınacaktır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	321,929,787 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	0
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	321,929,787 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 0
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 90
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

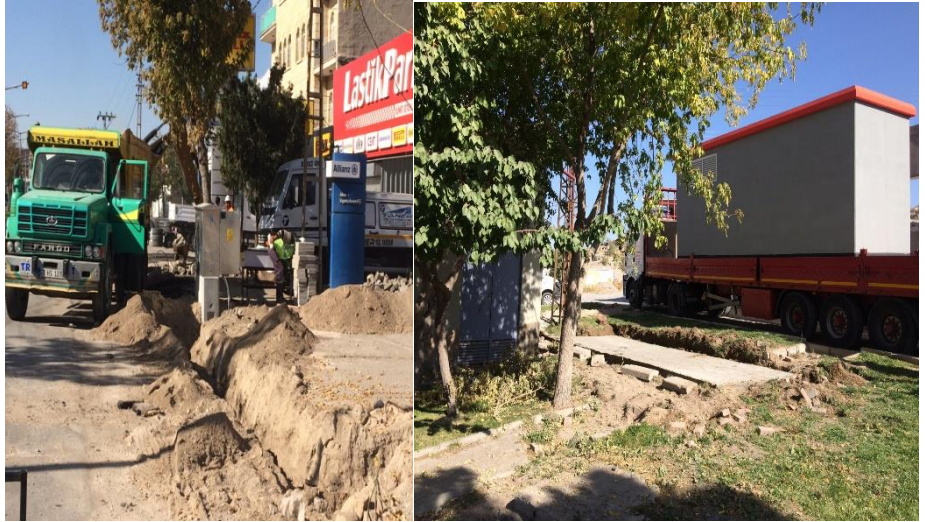
## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>NEVŞEHİR MERKEZ ÜRGÜP YOLU ORTA REFÜJ DEPLASESİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	15.09.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi - Merkez / Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Karayolları çalışmasından ve aydınlatma şebekesinin ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle aydınlatma hatları yenilenmektedir. 203 aydınlatma direği dikilecektir.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	163,598,21 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	0
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	163,598,21 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 45
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 88
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR


<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>NEVŞEHİR TOKİ 1,2,3 TRAAFOLARINA AİT ŞEBEKE VE AYDINLATMA TESİSİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	05.05.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Merkez Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Yol yapım çalışmalarından dolayı yolda kalan aydınlatma direklerinin uygun yere alınması ve yeni yapılar için şebeke ilavesi.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	310.678,519 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	265.585,6 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	310.678,519 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%97,01
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%97.52
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.2 adet ad3 direk beklenmektedir. Kabul aşamasındadır.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR


<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>NEVŞEHİR TR 39 KULE TIPI BINANIN MOD BINA OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	14.08.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Mehmet Akif Ersoy Fevzi Çakmak Caddesi Merkez Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve cadde üzerinde bulunana havai hatların yer altına alınması.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	1.159,938,9135 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	42.890,33 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	1.159,938,9135 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%42,07
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%70.52
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur. Tesis Çalışması devam ediyor.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	



## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>NEVŞEHİR TR64' ÜN MOD BİNA OLARAK YAPILMASI VE AG VE OG HATLARININ DA YER ALTINA ALINMASI İŞİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	14.08.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Raşit Bey Mahallesi Merkez Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Yeni imar durumuna göre aydınlatma şebekesi yapılması ve Belediye ' ye ait yeni tesislere enerji verilmek amacı ile proje hazırlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	243.502,366 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	140.420,32TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	243.502,366 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%51,01
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%48.52
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur. Tesis Çalışması devam ediyor.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>NEVŞEHİR TR135 VE 134' ÜN C KOLLARININ YER ALTINA ALINMASI İŞİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	14.08.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Bahçeli Evler Mahallesi Merkez Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Ekonomik ömrünü tamamlayan şebekenin yer altına alınması.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	764.683,2625 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	298.956,00 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	764.683,2625 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%70,11
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%82
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur. Tesis Çalışması devam etmektedir.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>Ömer UÇAR (21 . madde kapsamında tesis yapım işi)</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	08.10.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Nar Kasabası Merkez Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	21. Madde kapsamında tesis yapım işi
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	41.104.97 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	40.097,44 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	41.104.97 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%0,01
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%0,01
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Tesiste herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>Özkonak Dağıtım Merkezi Yapılması</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	10.06.2017 – Devam Ediyor
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Ragıp Üner Mah. Özkonak Kasabası Avanos
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Özkonak Kasabasına gelen enerji nakil hattı korumasız olarak şebekeye bağlanmaktadır. Ve bir arıza durumunda bütün kasaba enerjisiz kalmaktadır. Dağıtım merkezi yapılarak, arızanın tespiti ve sürekliliği sağlanacaktır. Ayrıca Göynük köyüne alternatif besleme için hat yapılacaktır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	682.015,03 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	399.120,22 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	682.015,03 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 59
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 90
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>NEVŞEHİR 105 TR GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE ISLAHI</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	07.06.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	15 Temmuz Mahallesi Merkez Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Artan Güç taleplerini karşılamak, Kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yedek besleme hatları ( RİNG) yapılarak. 250 kva direk tipi trafo 630 kVA ya yükseltilecek ve Monoblok içerisine alınacaktır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	277.376,52 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	200.003,83 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	277.376,52 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	%72,11
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	%95
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>Ürgüp Kavaklıönü Mahallesi TR8 – TR9 Trafo Kapasite Artışı</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	22.08.2017 – Devam Ediyor
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Kavaklıönü Mahallesi Ürgüp
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Kavaklıönü Mahallesi, Osman Elmacı Cad, 32 Cad ve Yunus Emre Caddesindeki yapılaşma sebebiyle Mevcut Trafonun kapasitesinin artırılması planlanmaktadır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	52.719,26 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	0 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	52.719,26 TL
<b>NAKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 0
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 0
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>YAZIHÖYÜK SULAMA KÖK 1</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	07.06.2017 – 31.12.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Yazihöyük Kasabası – Derinkuyu / Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	129,236,45 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	0
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	129,236,45 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 70
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 95
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	


## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>YAZIHÖYÜK SULAMA KÖK 3</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	07.06.2017 – 05.10.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Yazihöyük Kasabası – Derinkuyu / Nevşehir
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır .
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	131,620,95 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	131,620,95 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 70
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 95
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	





## DEVAM YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KÜÇÜK EK TESİSLERİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	03.03.2017-01.06.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Hacıbektaş Gülşehir ve Kozaklı ilçeleri
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Vatandaşlardan ve Mahalli idarelerden gelen acil taleplerin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlardır.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	542.918,75 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	542.918,75 TL
<b>NAKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırımla ilişkin herhangi bir sorun yoktur
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

## DEVAM YATIRIMLAR

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KÜÇÜK EK TESİSLERİ</b>
<b>YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	03.03.2017 – 01.06.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Ürgüp Ve Avanos İlçesine Bağlı Tüm Bölge
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Vatandaş Enerji Talebi ve Şebeke İyileştirmesi
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	366603,38 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	366603,38 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	366603,38 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	
