




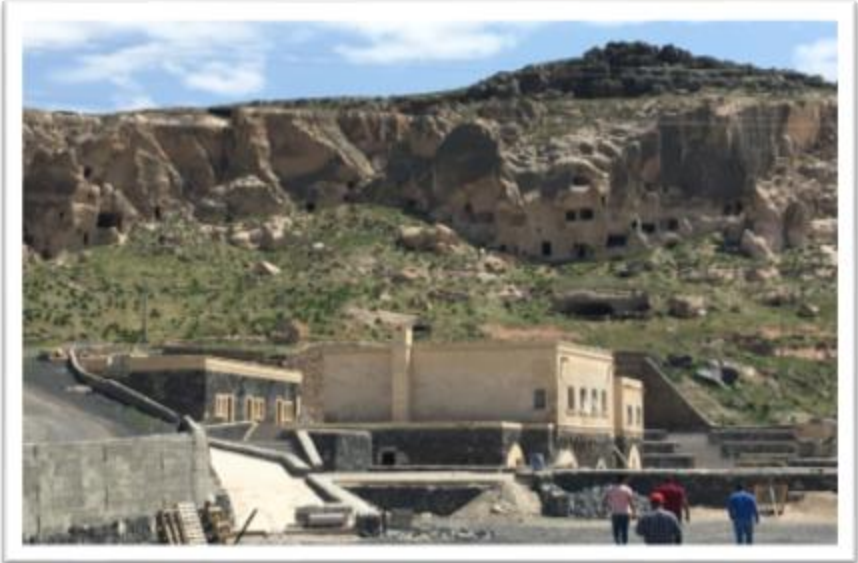


**KAYSERİ RÖLÖVE VE
ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ
NEVŞEHİR İLİ
TAMAMLANAN
YATIRIMLAR**

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR, ACIGÖL, TATLARIN YER ALTI ŞEHİRİ İKMAL ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	08.06.2015 - 10.10.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Nevşehir - Acıgöl
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Tatların Yer Altı Şehri Çevre Düzenlemesi İşİ kapsamında yapılamayan çevre düzenlemesi ve yeraltı şehri statik sağlamlaştırması birlikte 1.Etap da restorasyonuna başlayan evlerde çalışmalar yapılmaktadır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	2.214.254,90 TL (KDV Dahil)
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	2015 Yılı: 109.127,84 TL (KDV Dahil) 2016 Yılı: 1.266.519,04 TL (KDV Dahil) 2017 Yılı: 81.446,16 TL (KDV Dahil)
2017 YILI ÖDENEĞİ	2017 Yılı - 837.718,00 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 65
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 75
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

YATIRIMIN ADI	KAPADOKYA BÖLGESİ MÜZESİ MİMARİ, TEŞHİR-TANZİM, MÜHENDİSLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJELERİNİN YAPILMASI İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	11.09.2015 - 22.06.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Nevşehir - Avanos
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Nevşehir Müzesinin bölgedeki eserleri sergileme konusunda yetersiz kalması ve gelen turistler için yeni bir soluk oluşturması amacıyla bölge kaya dokusuyla uyumlu açılan kaya oymanın ve yeni bir ek bina ile müze olarak bölgeye kazandırılması amaçlanmaktadır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	370.362,50 TL (KDV Hariç)
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	2016 Yılı: 139.082,50 TL 2017 Yılı: 106.200,00 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	2017-231.279,00 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 70
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 95
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR KAYMAKLI YERALTI ŞEHİRİ ONARIMI VE AYDINLATMASI İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	06.01.2017 - 03.10.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Nevşehir - Kaymaklı
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Yetersiz olan yeraltı şehri aydınlatma alt yapısının hazırlanmış olan projesine uygun şekilde yenilenmesi ve yeraltı şehri içerisinde sağlamlaştırma-onarım işleri yapılmaktadır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	673.783,55 TL (KDV Dahil)
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	2017 Yılı: 290.744,89 TL (KDV Dahil)
2017 YILI ÖDENEĞİ	2017 - 149.000,00 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 65
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 65
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI BASİT ONARIMI İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.07.2017 - 05.09.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Nevşehir - Merkez
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Nevşehir Koruma Kurulu Ek Binası mutfak, doğalgaz tesisatı ve bahçe düzenlemesi işi yapılmaktadır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	53.235,44 TL (KDV Dahil)
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	2017 - 55.000,00 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	-
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	-
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR PAŞABAĞI ÖRENYERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ AYDINLATMA VE PANEL ÇİT YAPIMI İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.07.2017 - 05.09.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Nevşehir - Avanos
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Paşabağı Örenyeri karşılama merkezi ve çevresi gezinti alanının güvenliğini sağlamak için panel çit ve aydınlatması yapılmaktadır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	144.724,05 TL (KDV Dahil)
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	2017 - 150.000,00 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	-
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 40
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	
