



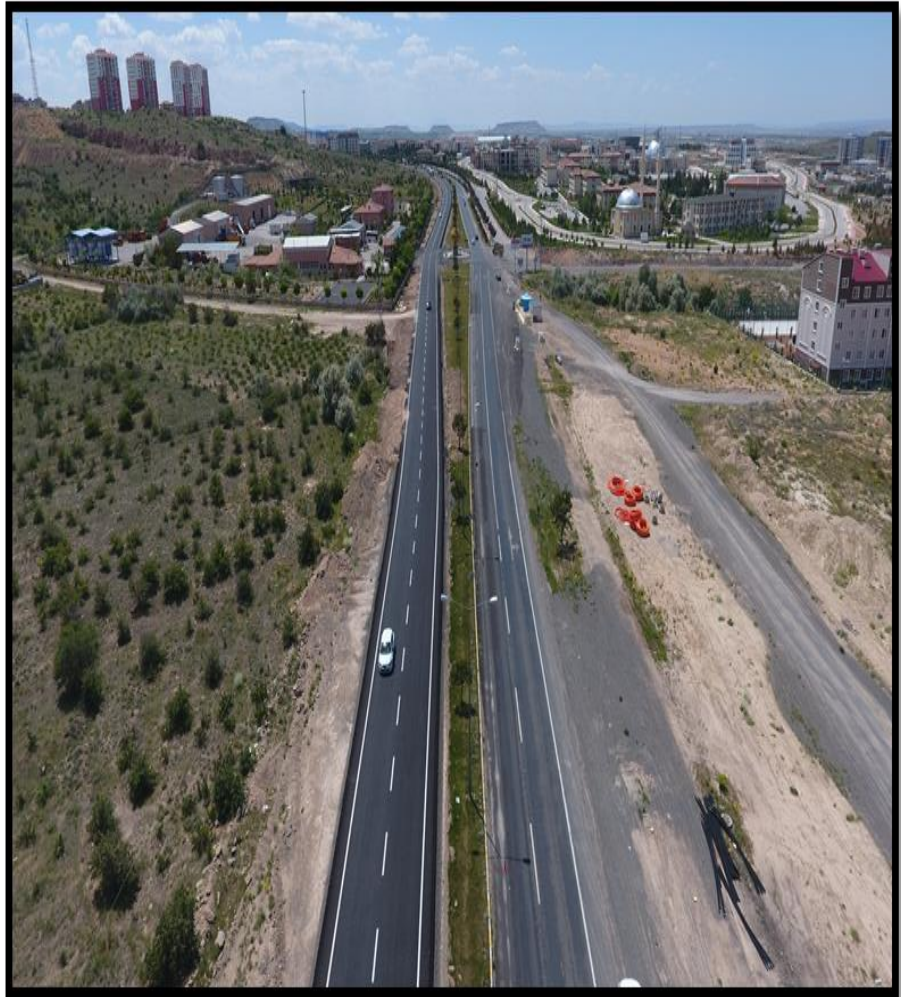



**KARAYOLLARI KAYSERİ
6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
NEVŞEHİR İLİ
DEVAM EDEN YATIRIMLAR**

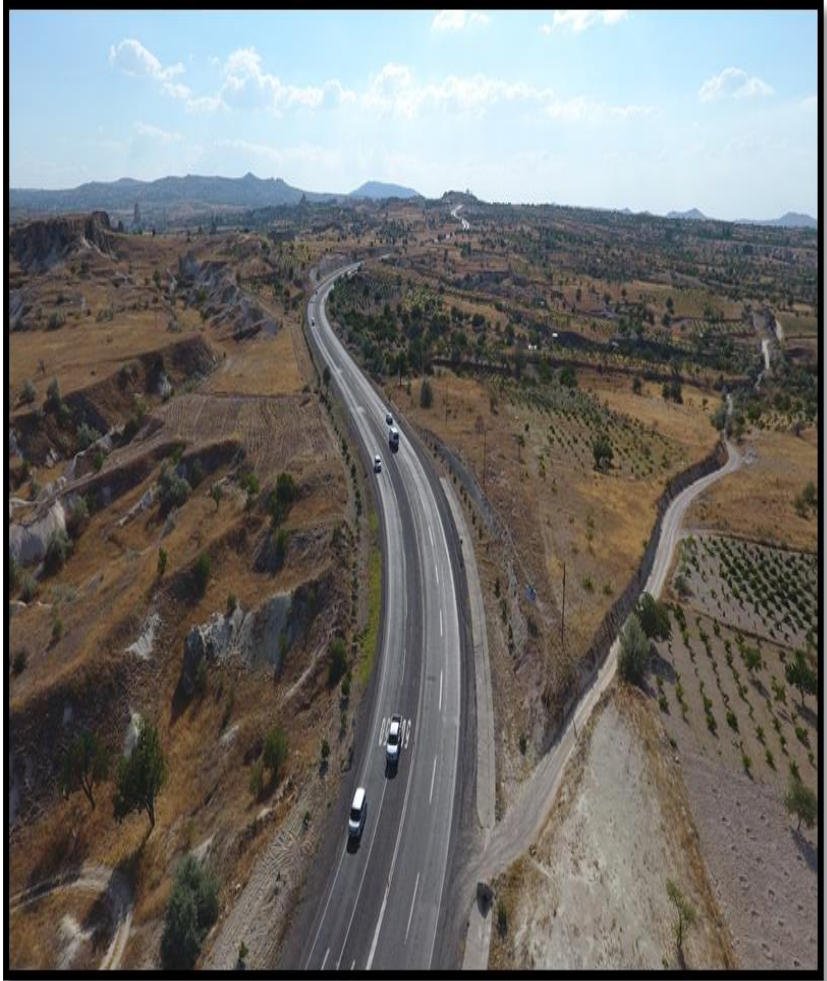



YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR - NİĞDE DEVLET YOLU BY İYİLEŞTİRME İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	06.07.2011 / 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	NEVŞEHİR - NİĞDE
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Proje uzunluğu 40,5 km olan yolun 19 km'si Nevşehir ili sınırlarında olup, tamamı BY standardındadır. BY iyileştirmesi ve kavşak düzenleme çalışmalarının yapılması amacıyla ihale edilmiştir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	15.135.000 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	2012 Yılı: 3.686.000 TL 2014 Yılı : 2.532.000 TL 2015 Yılı : 3.705.000 TL 2016 Yılı : 3.644.000TL 2017 Yılı : 650.000 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	685.000 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 93
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 93
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	2017 yılında 1.608.000 TL harcanarak, tamamlanması hedeflenmektedir.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


YATIRIMIN ADI	KAYSERİ-KIRŞEHİR YOLU (Hacıbektaş Ayr.-Kırşehir Çevre Yolu) BSK İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	12.07.2011 / 31.12.2018
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	NEVŞEHİR - KIRŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Proje uzunluğu 30,5 km olan yolun 20 km'si Nevşehir ili sınırlarında olup, tamamı BY standardındadır. Yolun üstyapısının BSK standardına yükseltilmesi amacıyla ihale edilmiştir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	68.676.000 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	2012 Yılı: 3.688.000 TL 2013 Yılı:11.506.000 TL 2014 Yılı: 17.207.000 TL 2015 Yılı:12.746.000TL 2016 Yılı: 6.400.000 TL 2017 Yılı : 600.000 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	1.000.000 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 63
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 66
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Geri kalan 4,3 km'lik kesimin (Kırşehir) aşınma seviyesinde ve 26,2 km'lik binderli kesimin aşınma seviyesinde tamamlanması hedeflenmiştir.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR ŞEHİR GEÇİŞİ YOLLARININ BSK YAPIM İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.08.2015 / 31.12.2018
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	NEVŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Toplam uzunluğu 28,5 km olan Nevşehir'in şehir geçişindeki yolların üstyapısının BSK standardına yükseltilmesi amacıyla ihale edilmiştir. (Nevşehir-Aksaray yolu 8 Km, Nevşehir-Niğde yolu 6,5 Km, Nevşehir-Ürgüp yolu 4 Km, Nevşehir-Avanos yolu 6 Km ve Nevşehir-Gülşehir yolu 4 Km)
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	52.843.000 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	2016 Yılı : 3.216.000 TL 2017 Yılı : 15.820.000 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	6.000 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 35
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 74
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	2017 yılında 20.000.000 TL harcanarak, 8 km'lik kesimin binder seviyesinde tamamlanması hedeflenmektedir.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

YATIRIMIN ADI	(HACIBEKTAŞ-NEVŞEHİR) AYR.-GÜLŞEHİR-TUZKÖY YOLU BSK İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	22.05.2017 / 20.08.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	NEVŞEHİR - KIRŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Toplam 13 km uzunluğunda olan yolun üstyapı standardını yükseltmek ve Tuzköy Havaalanı'na ulaşımın daha konforlu olmasını sağlamak amacıyla BSK yapılması için ihale edilmiştir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	6.851.000 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	2017 Yılı : 1.000.000 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	-
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 14
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 51
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	2017 yılında aşınma seviyesinde tamamlanması hedeflenmektedir.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR-ÜRGÜP ve ÜRGÜP-(BOĞAZKÖPRÜ-NİĞDE) AYR. YOLU BSK İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	01.05.2017 / 31.12.2020
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	NEVŞEHİR - KAYSERİ
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Toplam uzunluğu 14 km olan Nevşehir-Ürgüp yolu ile uzunluğu 38 km olan Ürgüp-(Boğazköprü-Niğde) Ayr. yollarının toplam uzunluğu 52 km olup, önemli doğu-batı koridorlarından olan yolun Kayseri ilini Kapadokya turistik bölgesine bağlaması nedeniyle ihale edilmiştir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	162.375.000 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	1.287.000 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	-
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	-
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	2017 yılında 10.000.000- TL harcanması ve 3 km'lik kesiminin tamamlanması hedeflenmektedir.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR GÜNEY ÇEVRE YOLU ve NEVŞEHİR-KAYMAKLI YOLU BSK YAPIMIŞI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	15.05.2017 / 31.12.2018
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	NEVŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Nevşehir-Kaymaklı devlet yolunun 2,7 km'lik kesimi ile Nevşehir Güney Çevre Yolunun 9,3 km'lik kesimi olmak üzere toplam 12 km uzunluğunda olan yolun üstyapısının BSK'lı olarak yapılması için ihale edilmiştir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	48.187.000 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	600.000 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	-
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	-
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	2017 yılında 6.000.000- TL harcanması ve 3 km'lik kesiminin tamamlanması hedeflenmektedir.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

YATIRIMIN ADI	(GÜLŞEHİR-HACIBEKTAŞ) AYR.-(AVANOS-NEVŞEHİR) AYR. YOLU BSK İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	10.08.2017 / 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	NEVŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	24 km uzunluğunda TY standardındaki yol sathi kaplamalı olup, üstyapısının BSK'lı olarak yapılması için ihale edilmiştir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	7.300.000 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	600.000 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	-
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	-
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	2017 yılında yolun tamamının BSK'lı olarak tamamlanması hedeflenmektedir.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

YATIRIMIN ADI	ÇARDAK KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	29.06.2015 / 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	NEVŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Nevşehir-Niğde yolu üzerinde yapılacak olan köprülü kavşak, Nevşehir Güney Çevre Yolu ile Nevşehir-Niğde yolunun kesişim noktasında bulunmaktadır. Köprülü kavşağın yapımıyla birlikte Nevşehir Güney Çevre Yolunun Nevşehir-Niğde Devlet Yoluna bağlantısında trafik güvenliği sağlanması amacıyla ihale edilmiştir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	15.842.000 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	2016 Yılı : 1.125.000 TL 2017 Yılı : 4.425.000 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	2.000.000 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 35
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 45
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	2017 yılında 13.913.000- TL harcanması ve 2 adet/64 m uzunluğundaki köprülü kavşağın tamamlanması hedeflenmektedir.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

YATIRIMIN ADI	HACIBEKTAŞ GRUBU KÖPRÜLERİ (103 EVLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI)
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	18.09.2015 / 28.06.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	NEVŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Nevşehir-Hacıbektas-(Kayseri-Kırşehir) Ayr. Yolu üzerinde bulunan 3 adet/ 134 m uzunluğunda köprülerin yapıyla birlikte trafik güvenliği sağlanması amacıyla ihale edilmiştir. 2 Adet/ 94 m uzunluğunda köprü ile Hacıbektas Köprülü Kavşağı trafiğe açılmıştır. Söz konusu bu proje 103 Evler Kavşağının yapılması için ikmal ihalesi olarak yapılmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	18.845.000 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	2.500.000 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	-
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	-
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Hacıbektas grubu köprüleri bünyesinde yer alan Çilehane Köprülü Kavşağı trafiğe açılmış olup, kesin hesap çalışmaları devam etmektedir. 103 Evler Kavşağı ve 5,7 km uzunluğunda ki bağlantı yolu için ikmal ihalesi yapılmıştır.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	
